



Wackernheim

K 18
Ausbau
Ortsdurchfahrt

Bürgerinformation
01. Juli 2024, 18 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim

Themen

- **Notwendigkeit der Maßnahme**
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation



**schlechter Zustand
von Fahrbahn und
Gehwegen**

K 18

**Ausbau Große Hohl, Kirchstraße, Heerstraße,
Rathausplatz, Mühlstraße**

Backhausstraße und Schulstraße

Baulastträger/Auftraggeber

- **Landkreis Mainz-Bingen**
- **Stadt Ingelheim**
- **Abwasserzweckverband Untere Selz (AVUS)**
- **Energieversorger Rhein Hessische**

Themen


- Notwendigkeit der Maßnahme
- **Planungen**
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- Kommunikation

Wackernheim

Gemeindestraßen

Kreisstraßen


Ausbauplanung

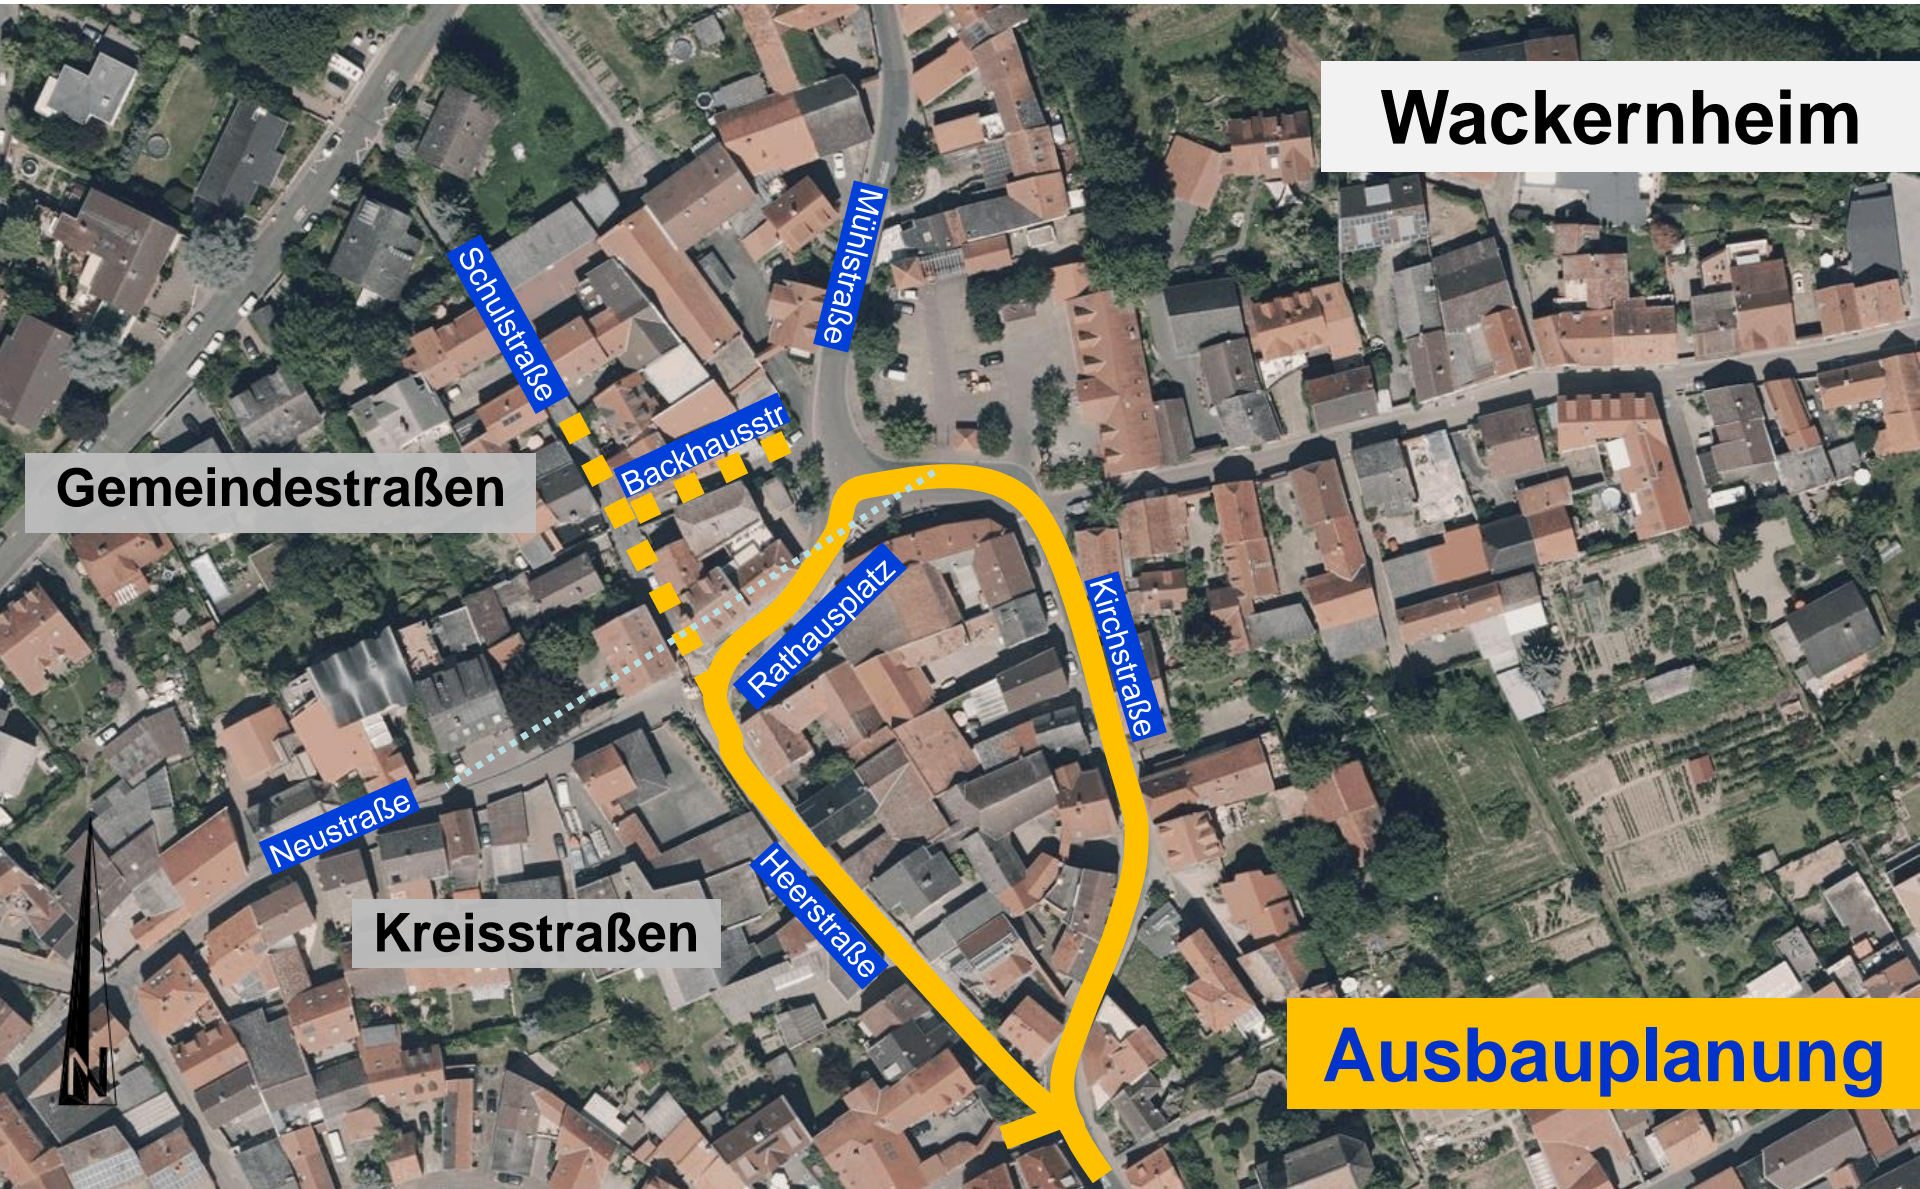




Bestand



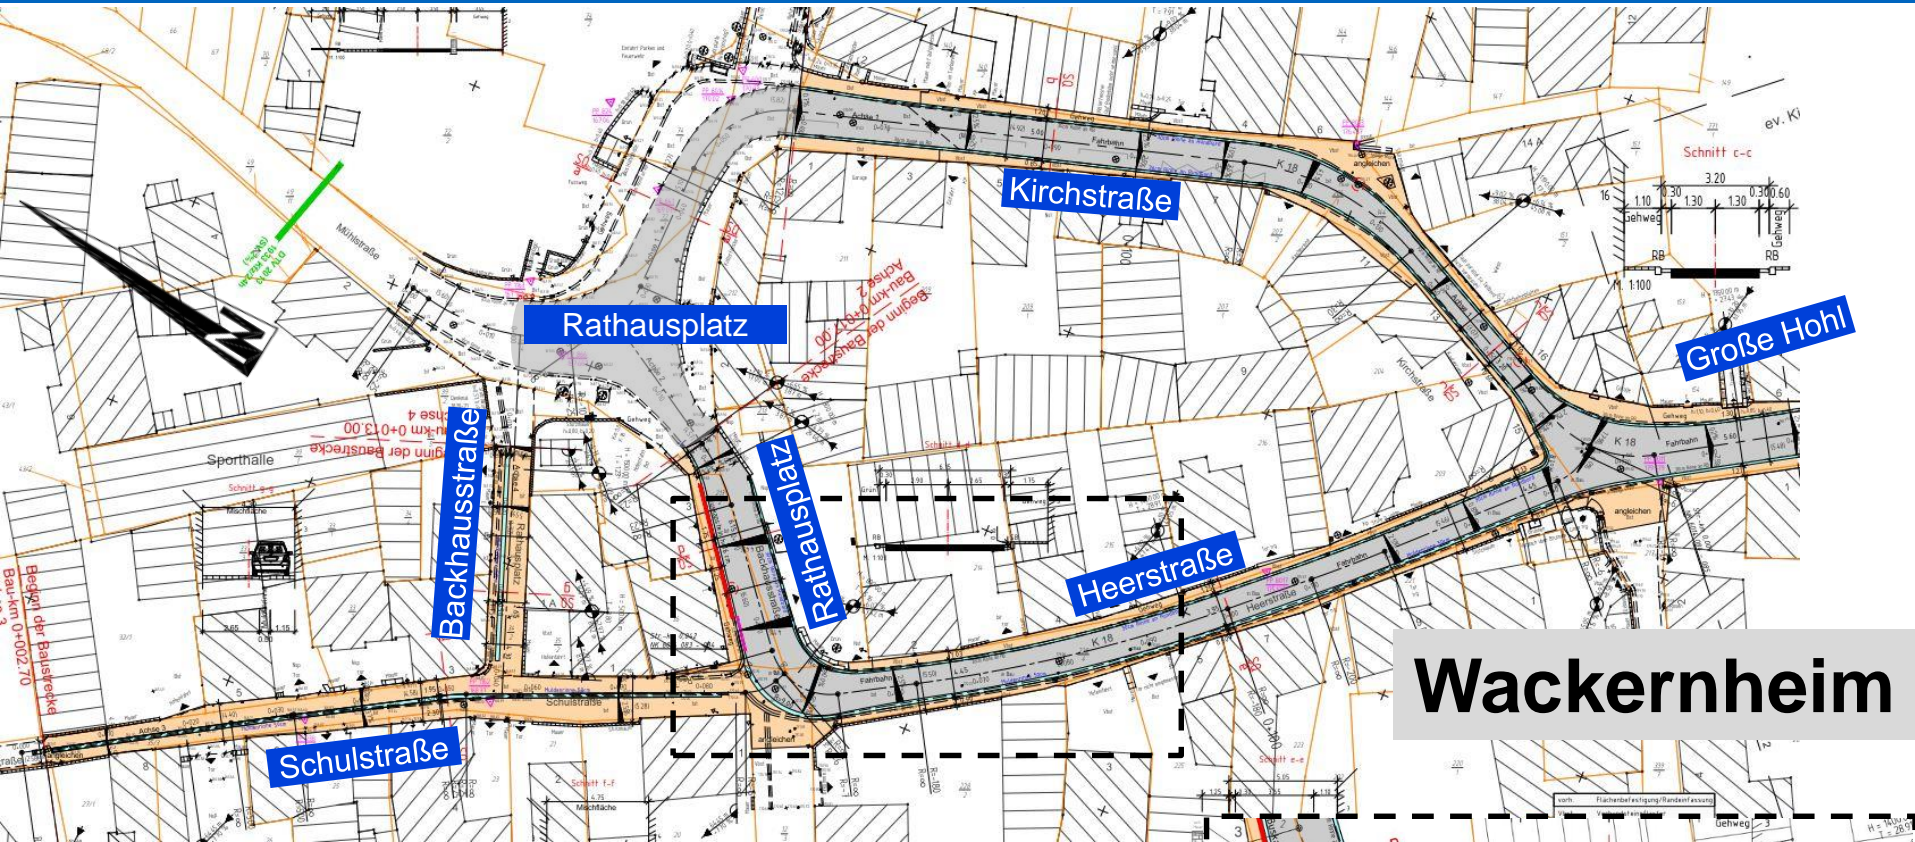

Wackerndorf

Breite Fahrbahn 3,20 bis 5,00 Meter
Breite Gehweg 0,50 bis 1,20 Meter

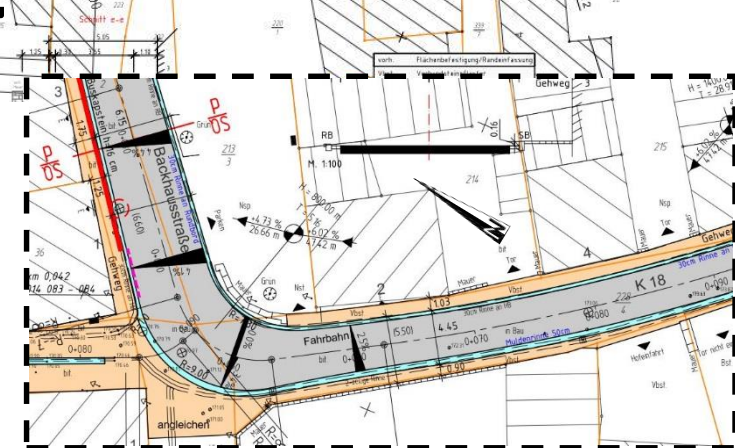



Wackerndorf

Kleine Hohl

Große Hohl

Schillerstraße

Ausbauplanung



Große Hohl

Bild: LBM Worms



Bild: LBM Worms

Große Hohl

Bestand




Kleine Hohl

Bild: LBM Worms



Bild: LBM Worms

Schillerstraße

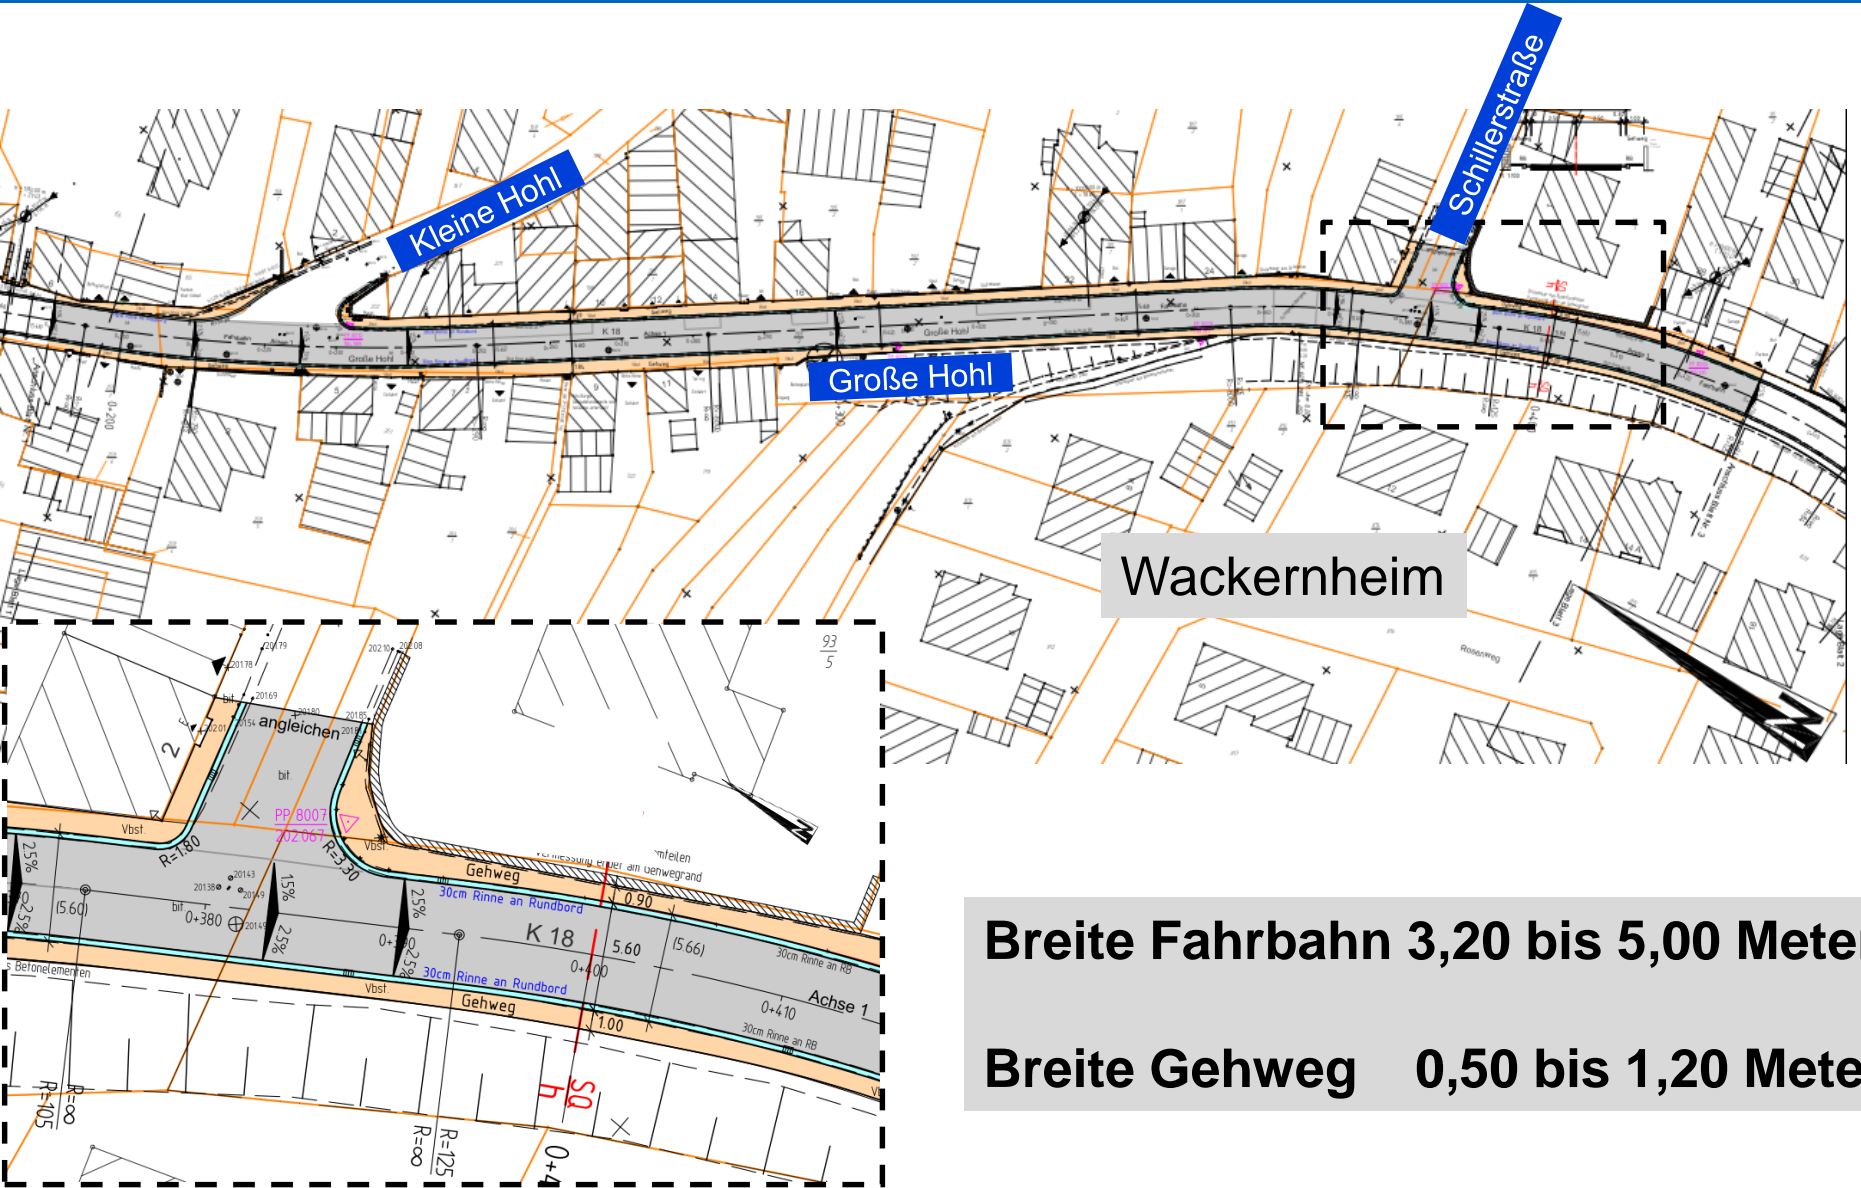

Breite Fahrbahn 3,20 bis 5,00 Meter
Breite Gehweg 0,50 bis 1,20 Meter





Große Hohl

Bild: LBM Worms



Bild: LBM Worms

Große Hohl
Jahnstraße rechts

Bestand



Große Hohl


Bild: LBM Worms




Bild: LBM Worms

Ende Große Hohl

Wackernheim

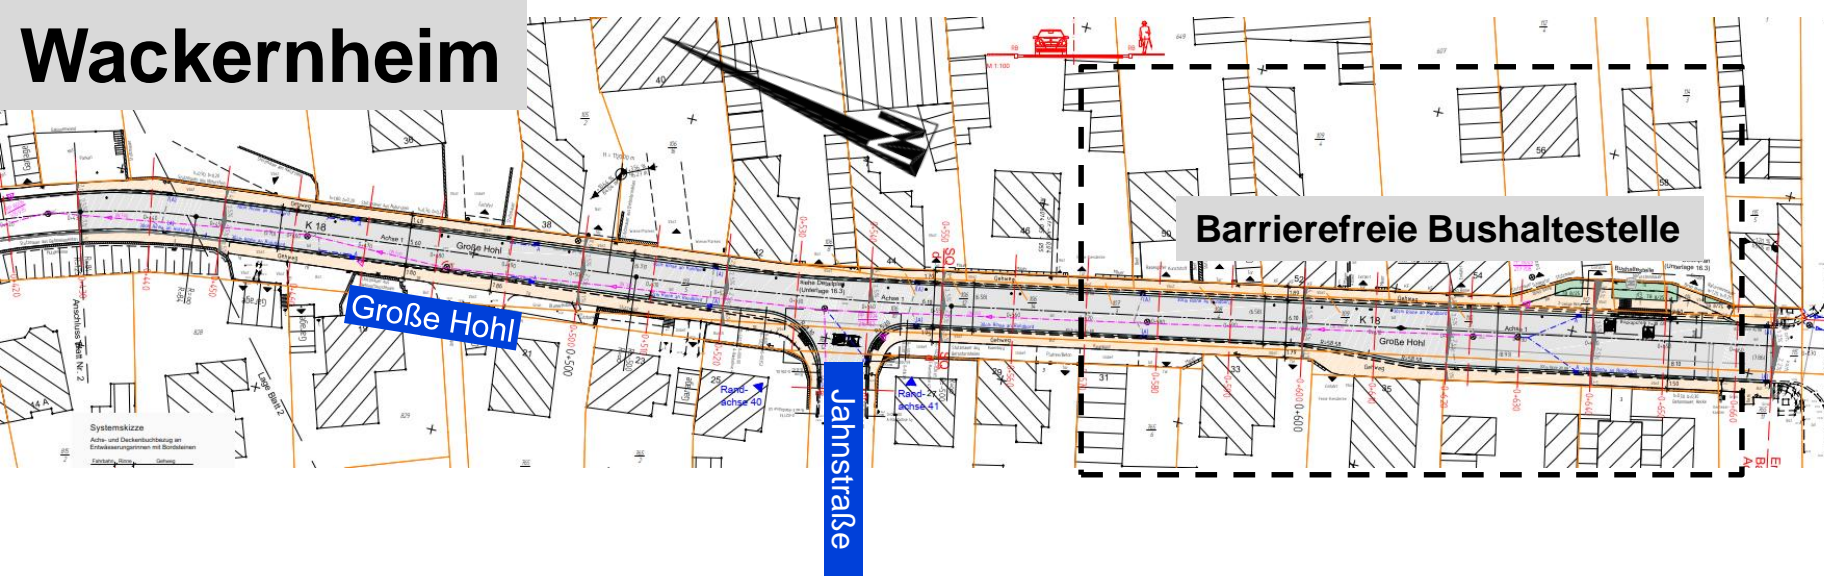

Mainzer Straße
L 419
Binger Straße


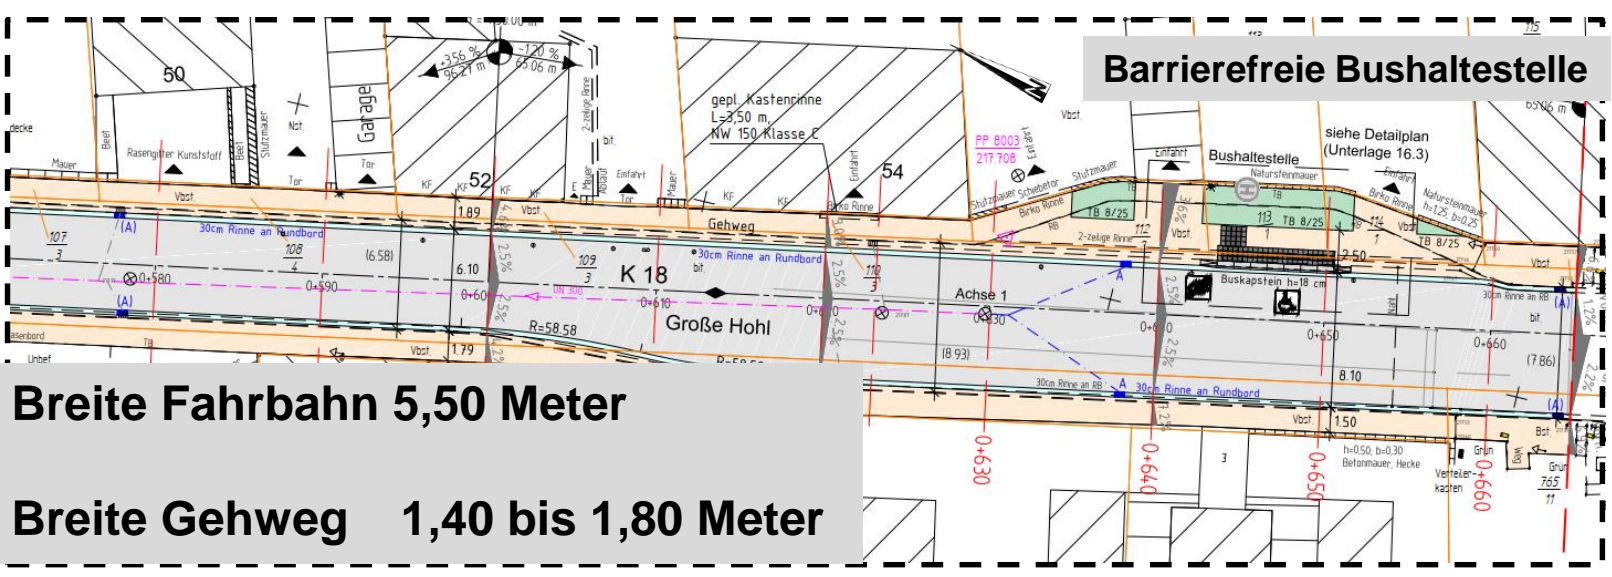


Breite Fahrbahn 5,50 Meter
Breite Gehweg 1,40 bis 1,80 Meter

Straßenquerschnitt


K18 (Rathausplatz Nr.3)

K 18 (Heerstraße Nr.7)

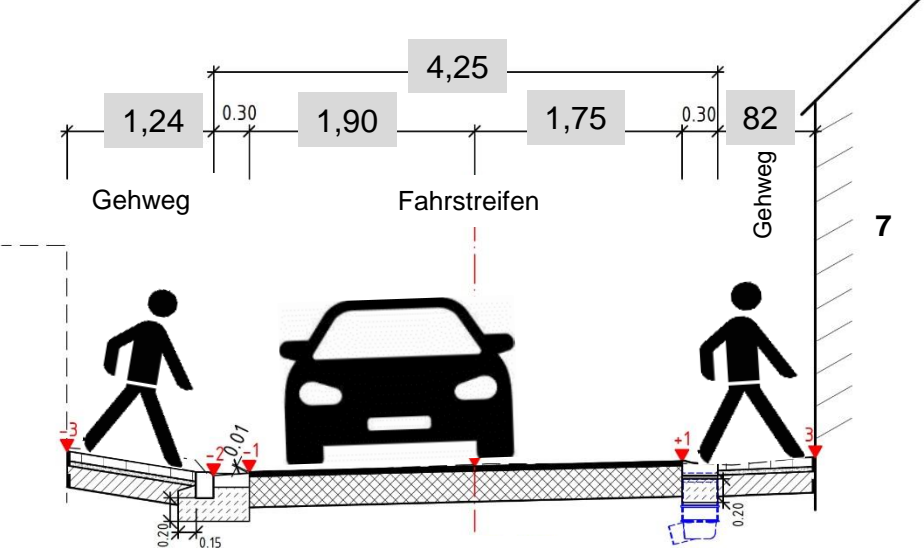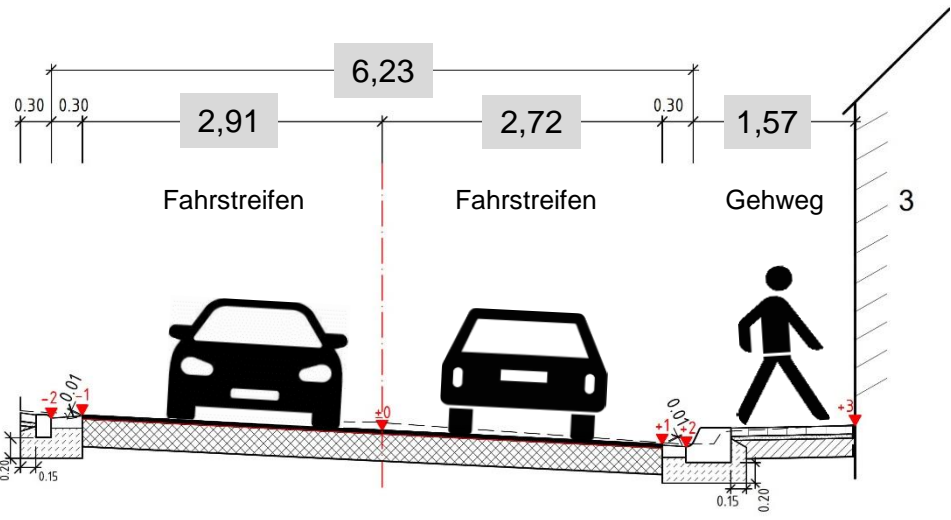


Straßenquerschnitt

Schulstraße Nr.3 und 4

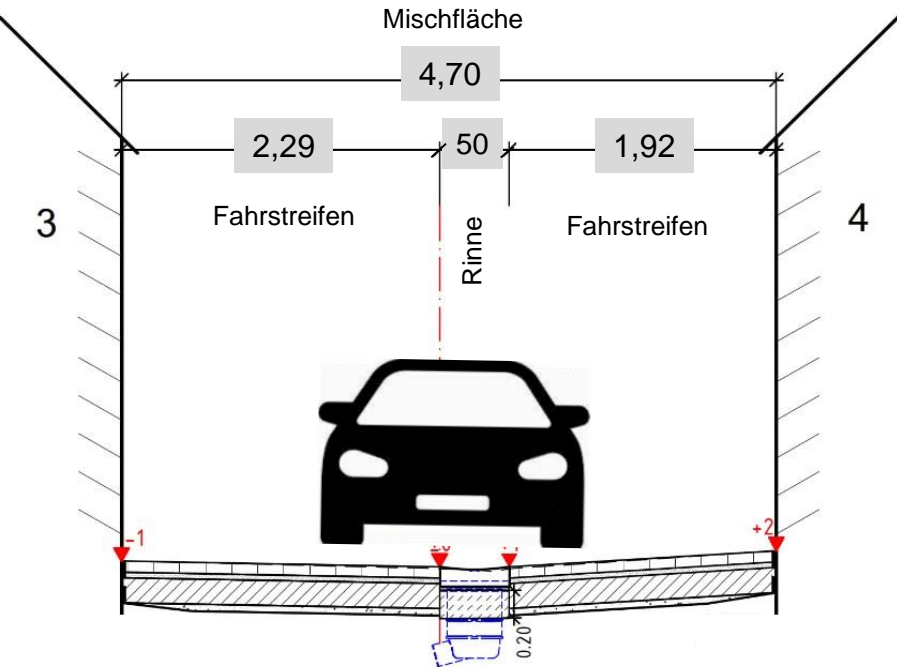

Backhausstraße 1A und 3

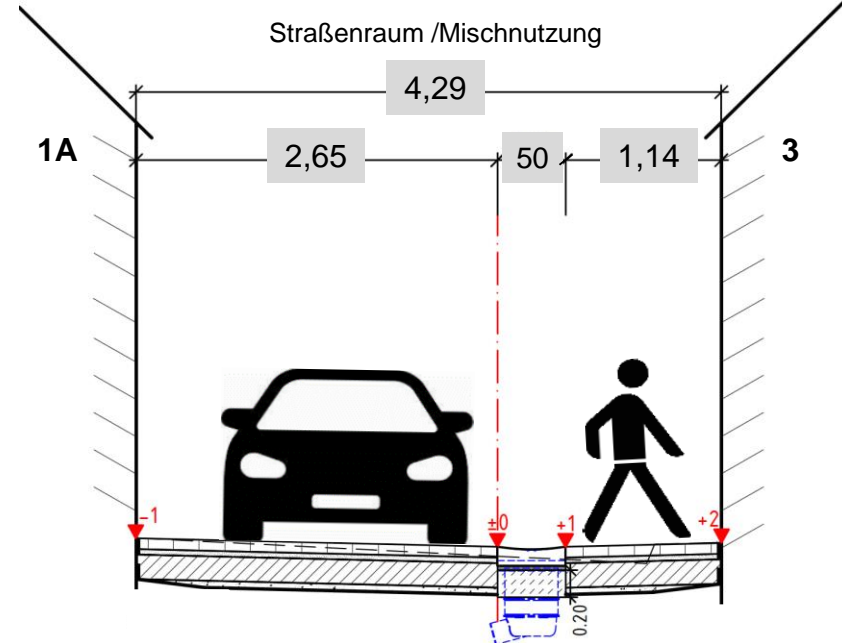

Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- **Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten**
- Kommunikation

Im Baustellenumfeld/Baustellenbereich

Begehung und Zustandserfassung
vor und nach Baudurchführung

- Gebäude / Bauwerke

Wer ist Gutachter?

Beweissicherung/Beweissicherungsverfahren

Sachverständiger

Ingenieurgesellschaft Tragwerk Angnes + Meister mbH

Turnierstraße 75

55218 Ingelheim am Rhein





Bild: LBM Worms



Bild: LBM Worms

Ausbau

Pflaster	1.900 m²
Bordsteine	1.600 m
Rinnenplatten	1.600 m
Asphalt	4.600 m²

Einbau

Pflaster	2.600 m²
Drainbetontragschicht	2.600 m²
Bordsteine	1.300 m
Rinne/Muldenrinnen	1.400 m
Asphalt	4.000 m²

Kosten und Kostenträger

Auftragssumme	2.056.000 Euro
Anteil Landkreis Mainz-Bingen	766.000 Euro
Anteil Stadt Ingelheim	703.000 Euro
Rheinhessische AVUS	366.000 Euro
AVUS	221.000 Euro

Auftragnehmer
Firma HEBAU GMBH
Carl-Zeiss-Straße 11 55129 Mainz



- **Arbeitszeit 8 - 10 Stunden**
- **5 Tage Woche**
- **Abschnittsweises Bauen**
- **Länge der Bauabschnitte**
- **Platzverhältnisse**
- **Leistungsarbeiten**
- **Sicherungsarbeiten**
- **Untergrundverhältnisse**
- **Unbekannte Leitungen**
- **Witterung, ...**





Bild: LBM Worms

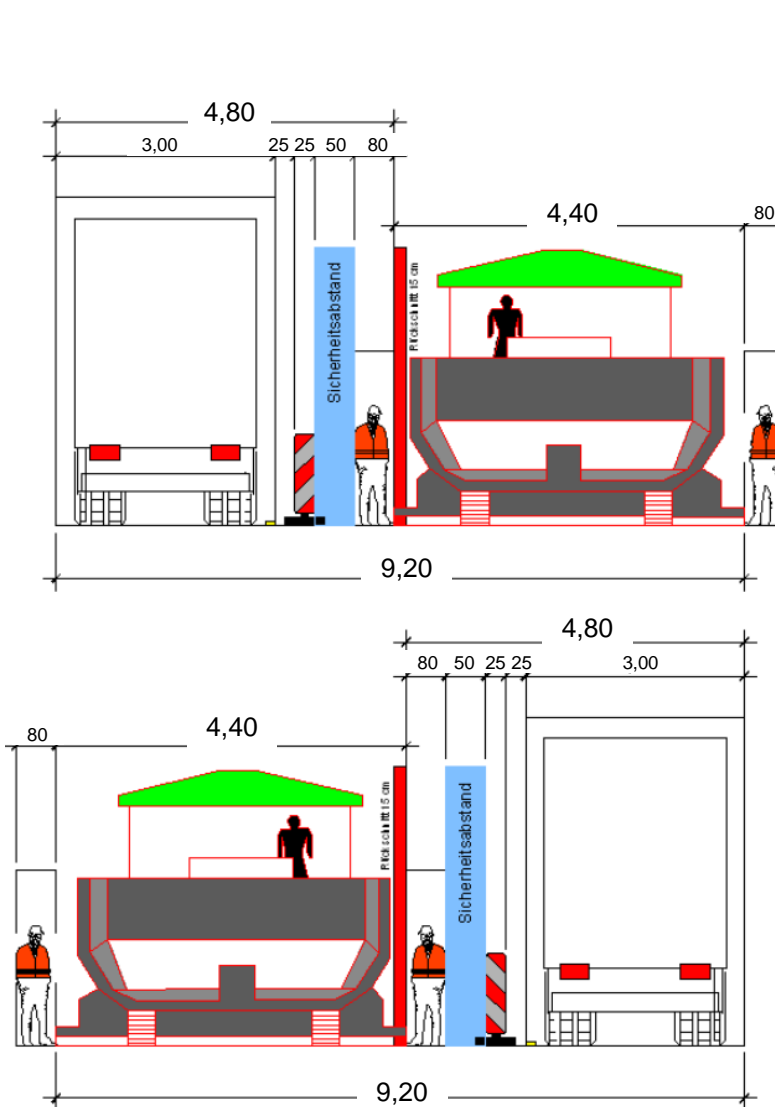


Bild: LBM Worms



Bild: LBM Worms








Es dürfen sich keine Beschäftigten im Sicherheitsabstand aufhalten!
(BGR/ GUV) – R 2108

Arbeitsraum
Platzbedarf arbeitender Mensch
• Mindestmaß 0,50 Meter
• f (Tätigkeit)

Arbeitsbereich

Verkehrsbereich

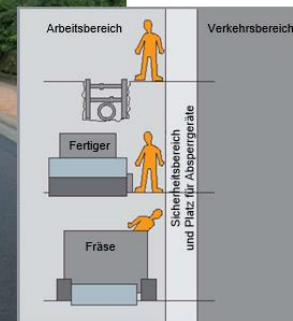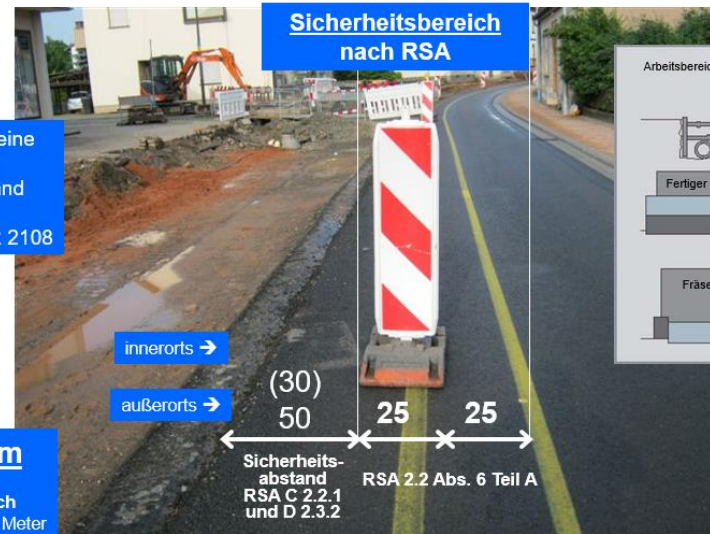

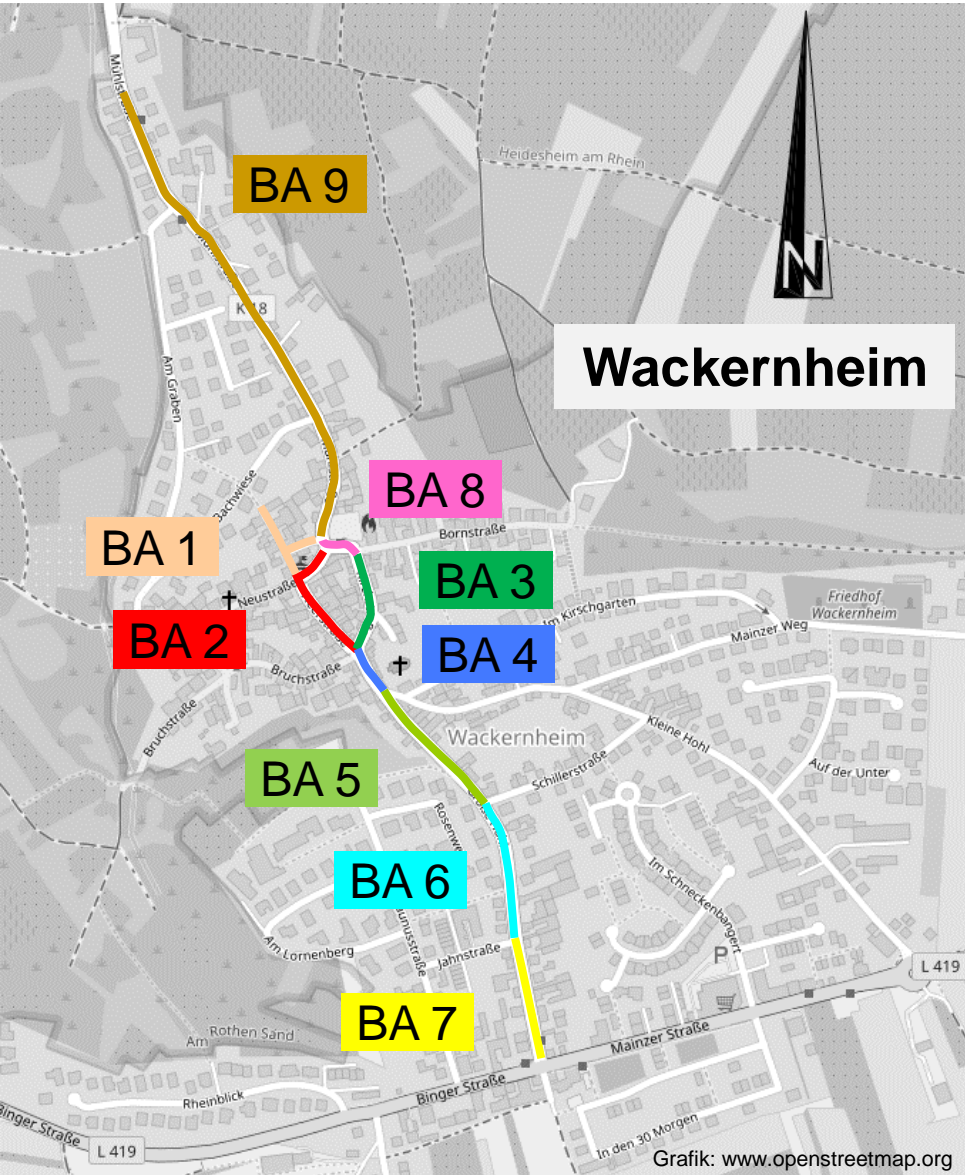

- Abschnitt 1 „städtisch, Rhein Hessische, AVUS“:
Schulstraße & Backhausstraße
- Abschnitt 2 „städtisch, Landkreis, Rhein Hessische“
Heerstraße / Rathausplatz
- Abschnitt 3 „städtisch, Landkreis, Rhein Hessische“
Kirchstraße
- Abschnitt 4 „städtisch, Landkreis, Rhein Hessische“
Heerstraße / Kirchstraße
- Abschnitt 5 „städtisch, Landkreis, Rhein Hessische“
Große Hohl
- Abschnitt 6
„städtisch, Landkreis,
Rhein Hessische“
Große Hohl
- Abschnitt 7
„städtisch, Landkreis,
Rhein Hessische“
Große Hohl
- Abschnitt 8 „Landkreis, Rhein Hessische, AVUS“
Bushaltestelle
- Abschnitt 9 „Landkreis“
Unterhaltung
Sanierung mehrerer Schadstellen entlang der
K18

Wackernheim



**Baustart
15. Juli 2024**

**Ab 15. Juli bis Mitte
August 2024
Abschnitt 4**

**Vollsperrung
Kirchstraße / Große Hohl**

Großräumige Umleitung




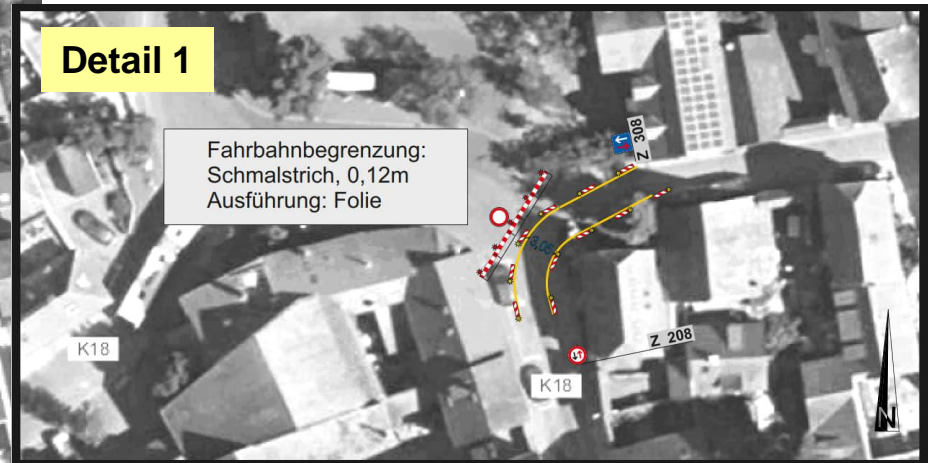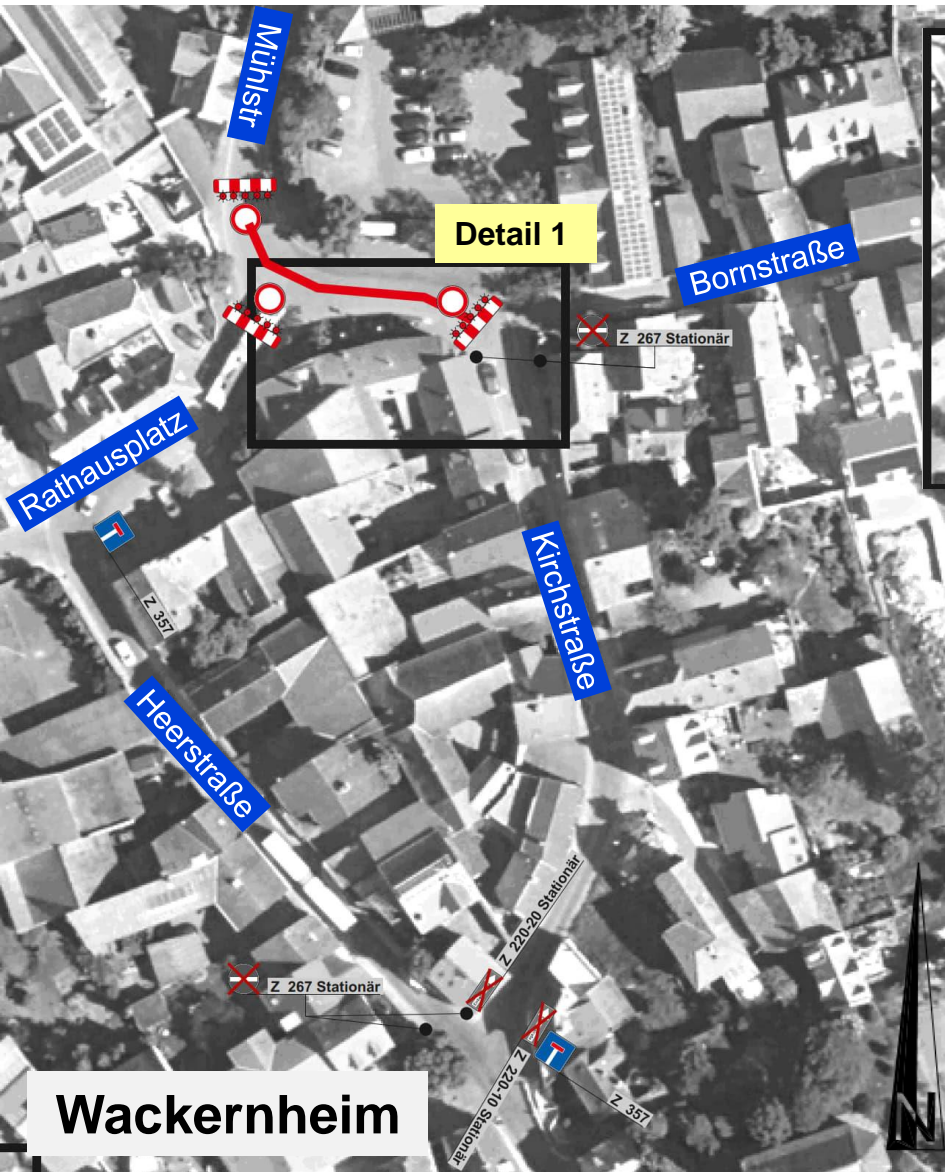

**Ab August bis
September 2024
Abschnitt 8**

Vollsperrung Mühlsr
Rathausplatz


Großräumige Umleitung

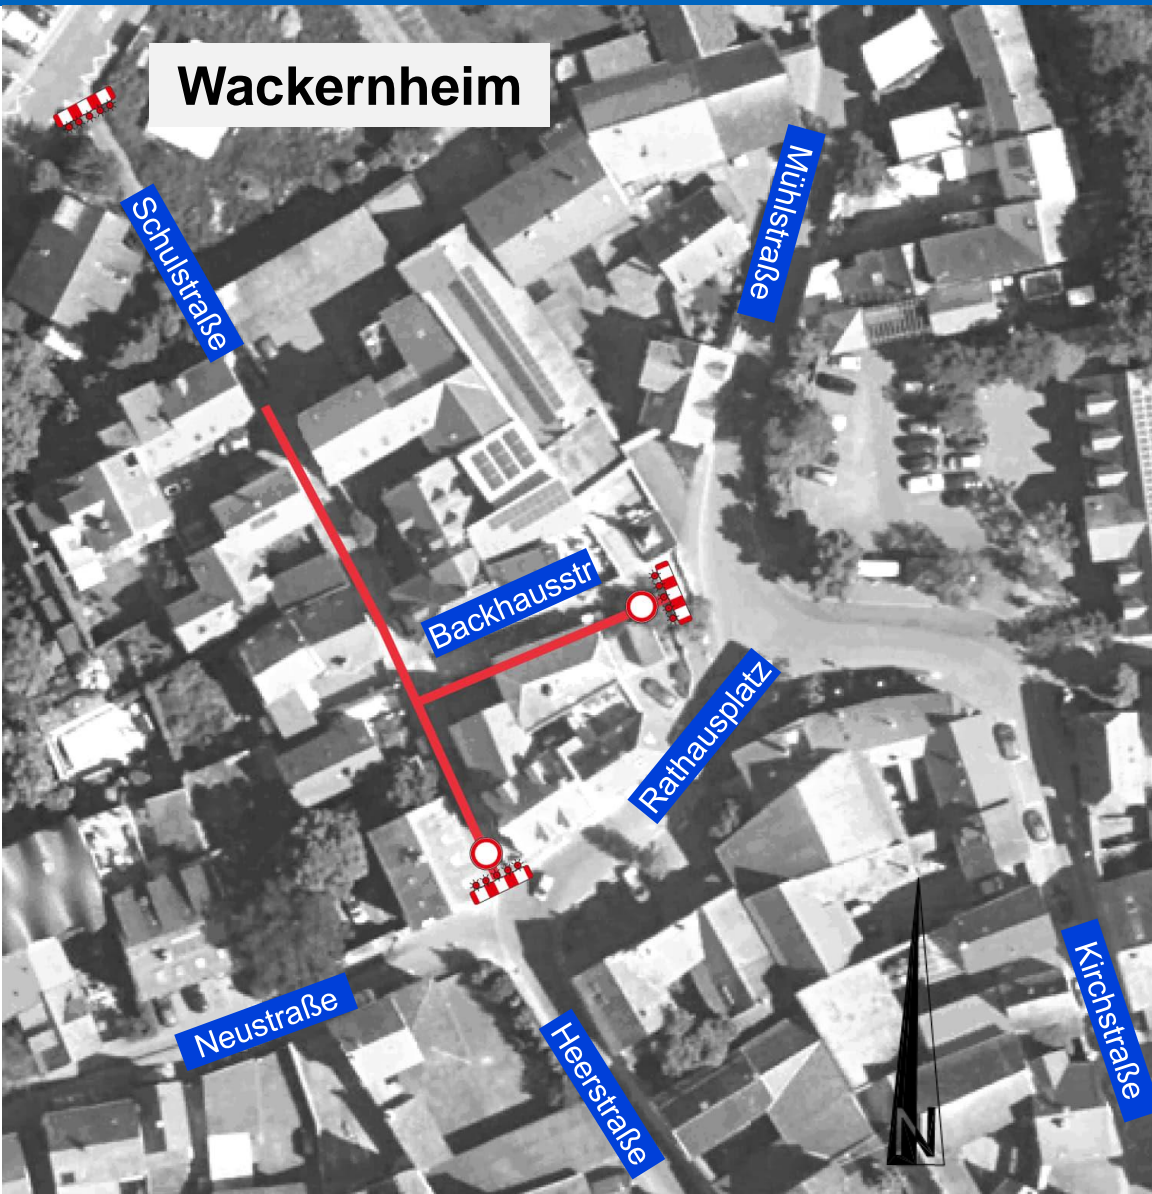

**Ab Mitte August bis
Ende September 2024
Abschnitt 1**

**Vollsperrung der Schulstraße
und Backhausstraße**

Zeitgleich mit Abschnitt 8

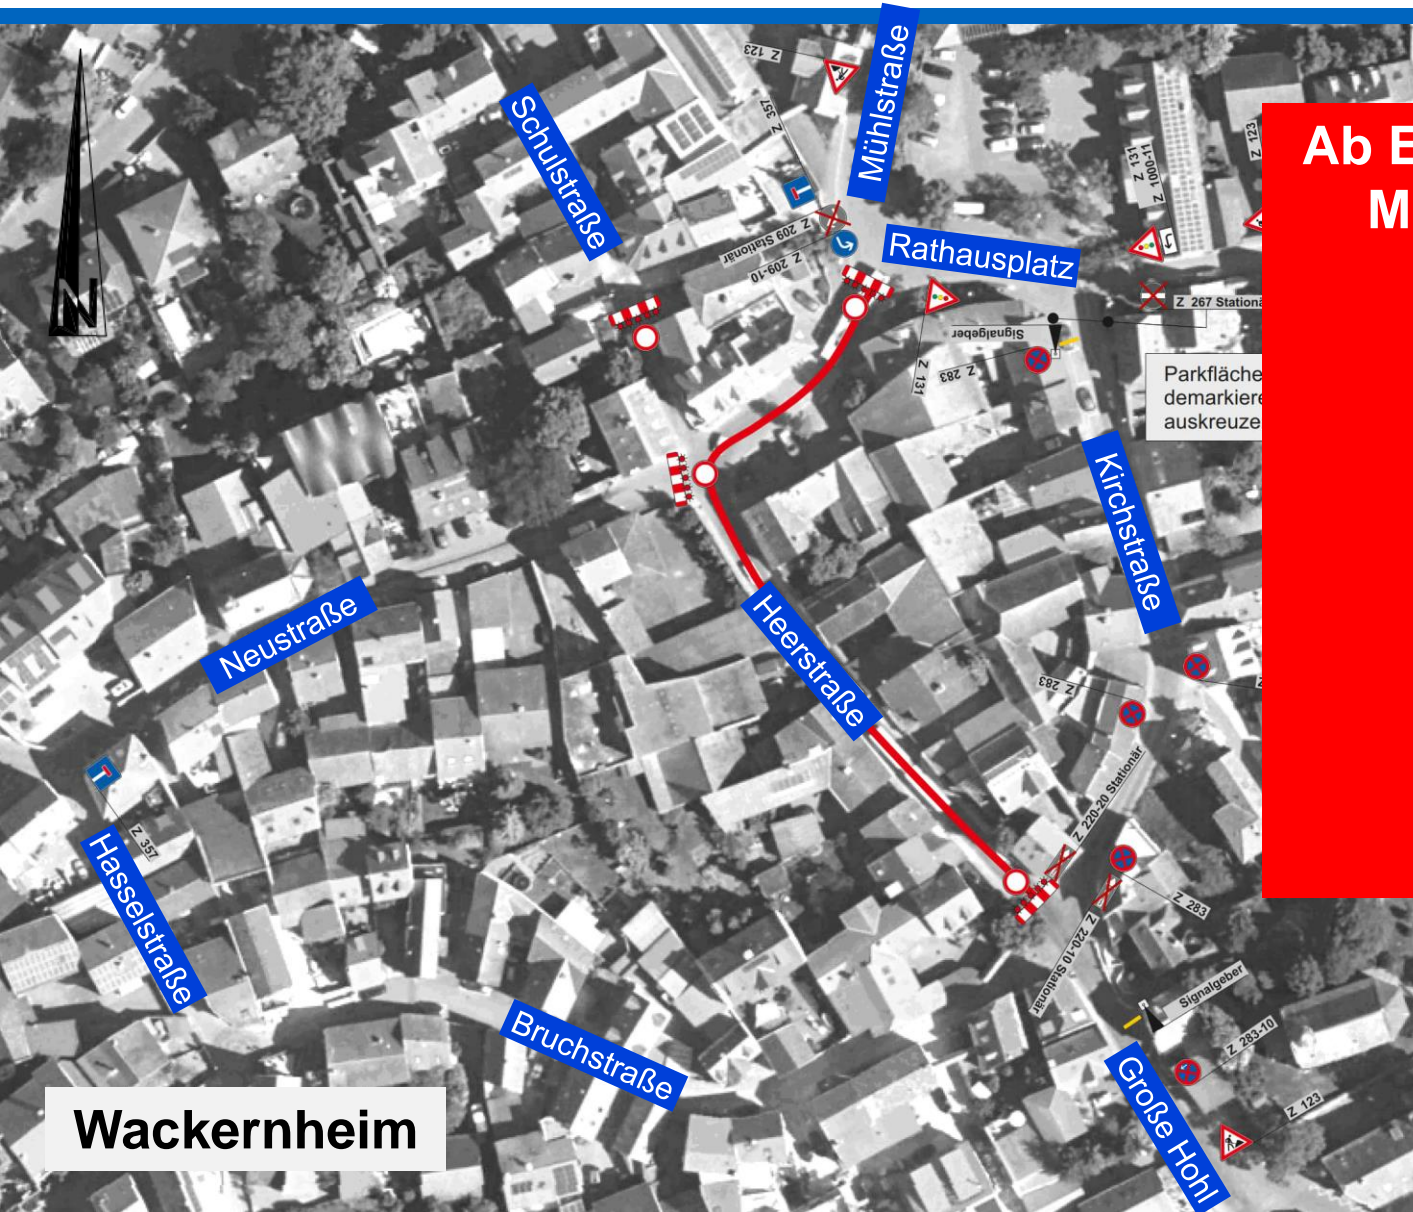


**Ab Ende September bis
Mitte November 2024
Abschnitt 2**

**Vollsperrung der
Heerstraße und
Backhausstraße**

**Umleitung über
Kirchstraße
Verkehrsregelung
Baustellenampel**

Wackernheim

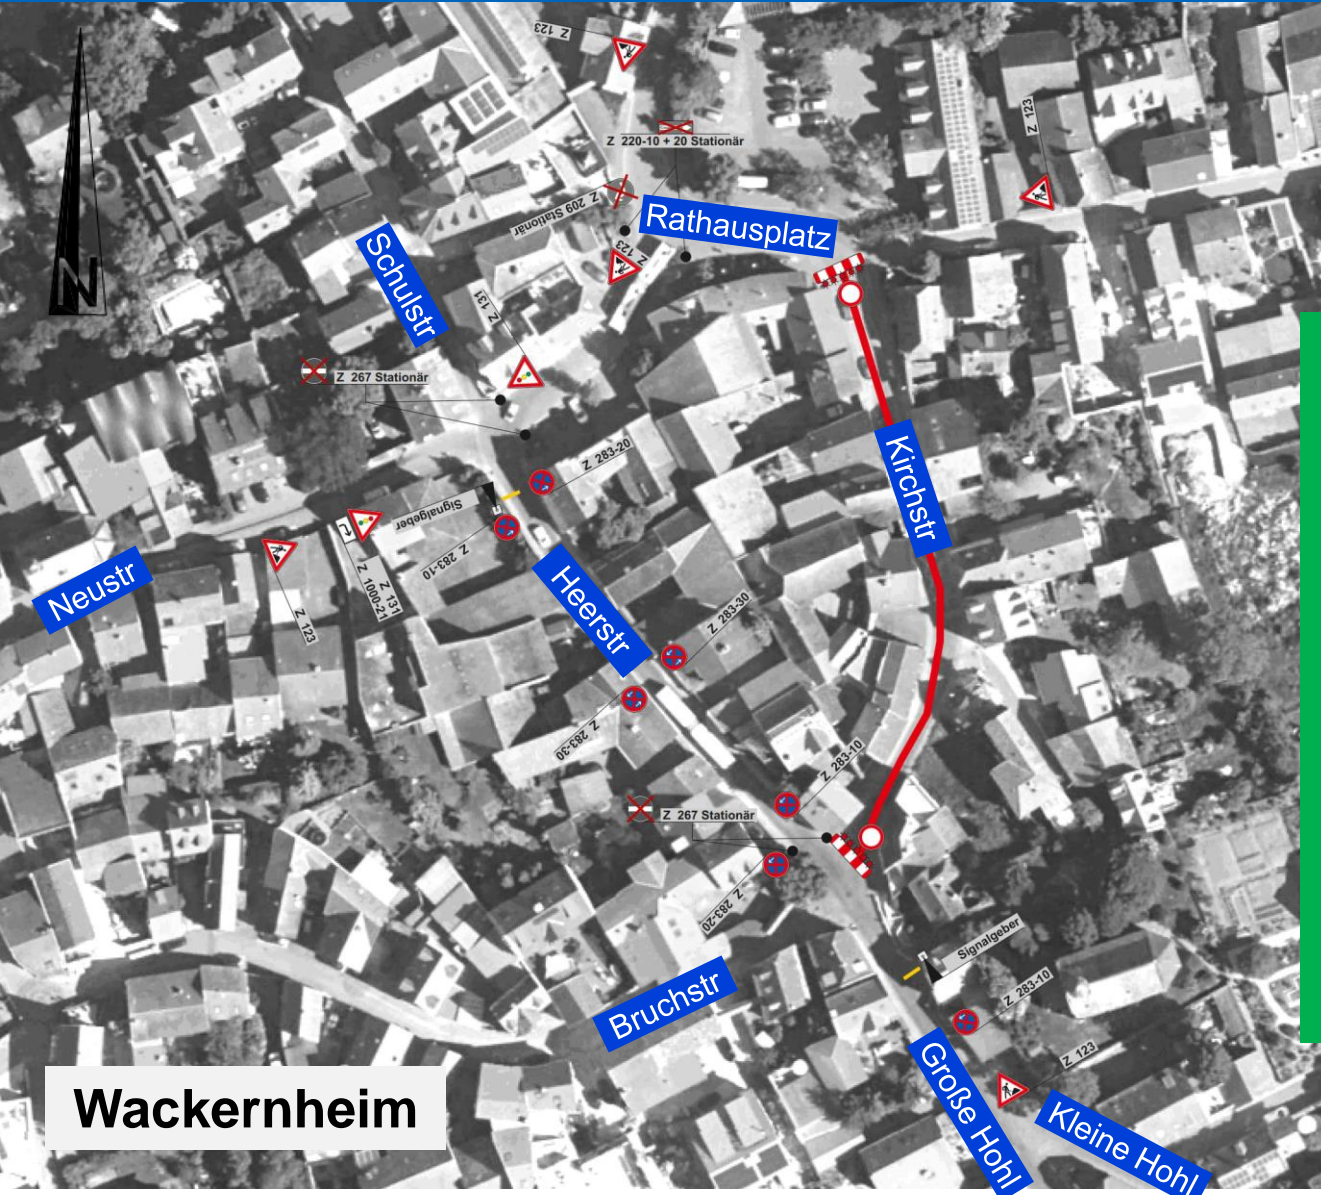


Wackernheim

**Ab Mitte November bis
Ende Dezember 2024
Abschnitt 3**

Vollsperrung der
Kirchstraße

Umleitung über
Heerstraße

Verkehrsregelung
Baustellenampel

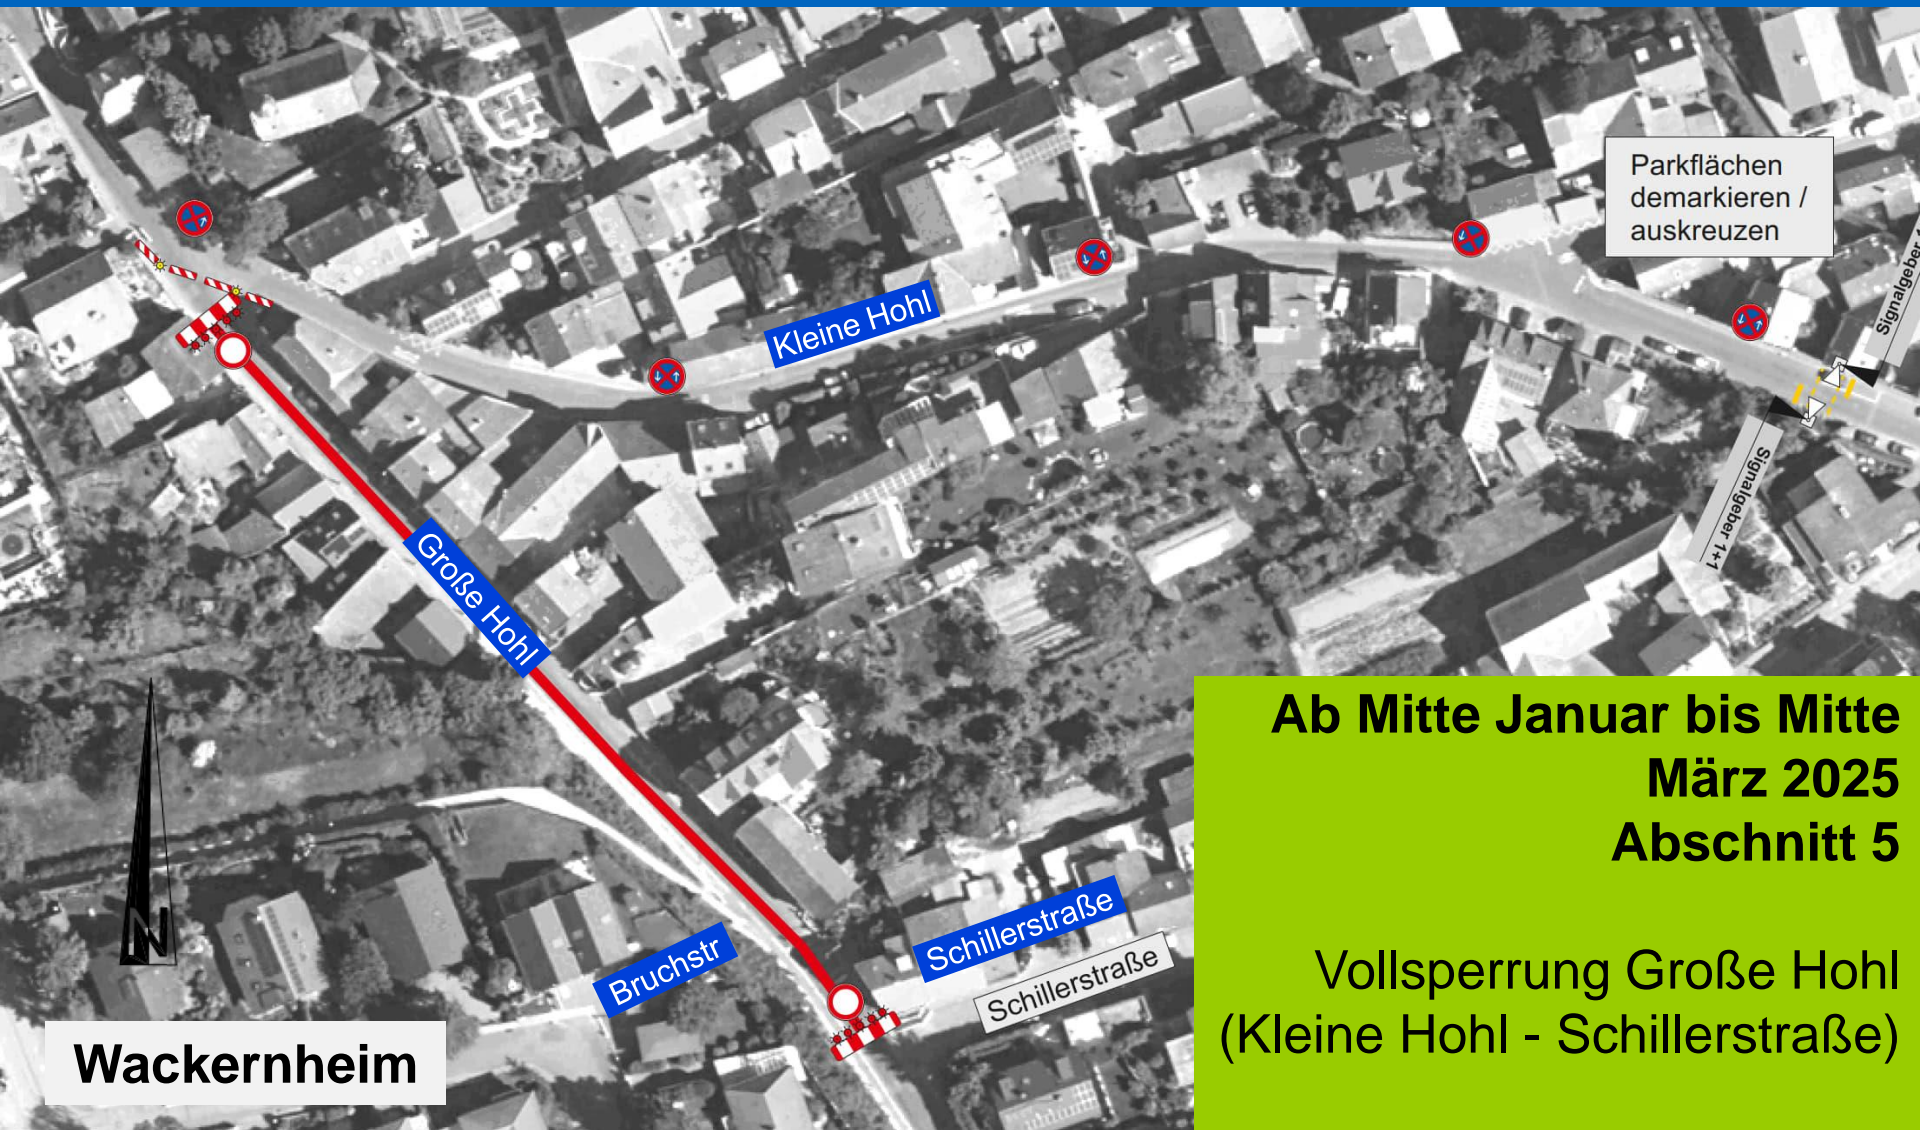

Ab Mitte Januar bis Mitte März 2025
Abschnitt 5

Vollsperrung Große Hohl
(Kleine Hohl - Schillerstraße)

Großräumige Umleitung



Wackernheim

**Ab Mitte März bis Anfang Mai 2025
Abschnitt 6**

**Vollsperrung
Große Hohl
(Schillerstraße - Jahnstraße)**

Großräumige Umleitung




Ab Anfang Mai bis Ende Juni 2025
Abschnitt 7

Vollsperrung
Große Hohl (Jahnstraße – L 419)

Großräumige Umleitung

Wackernheim

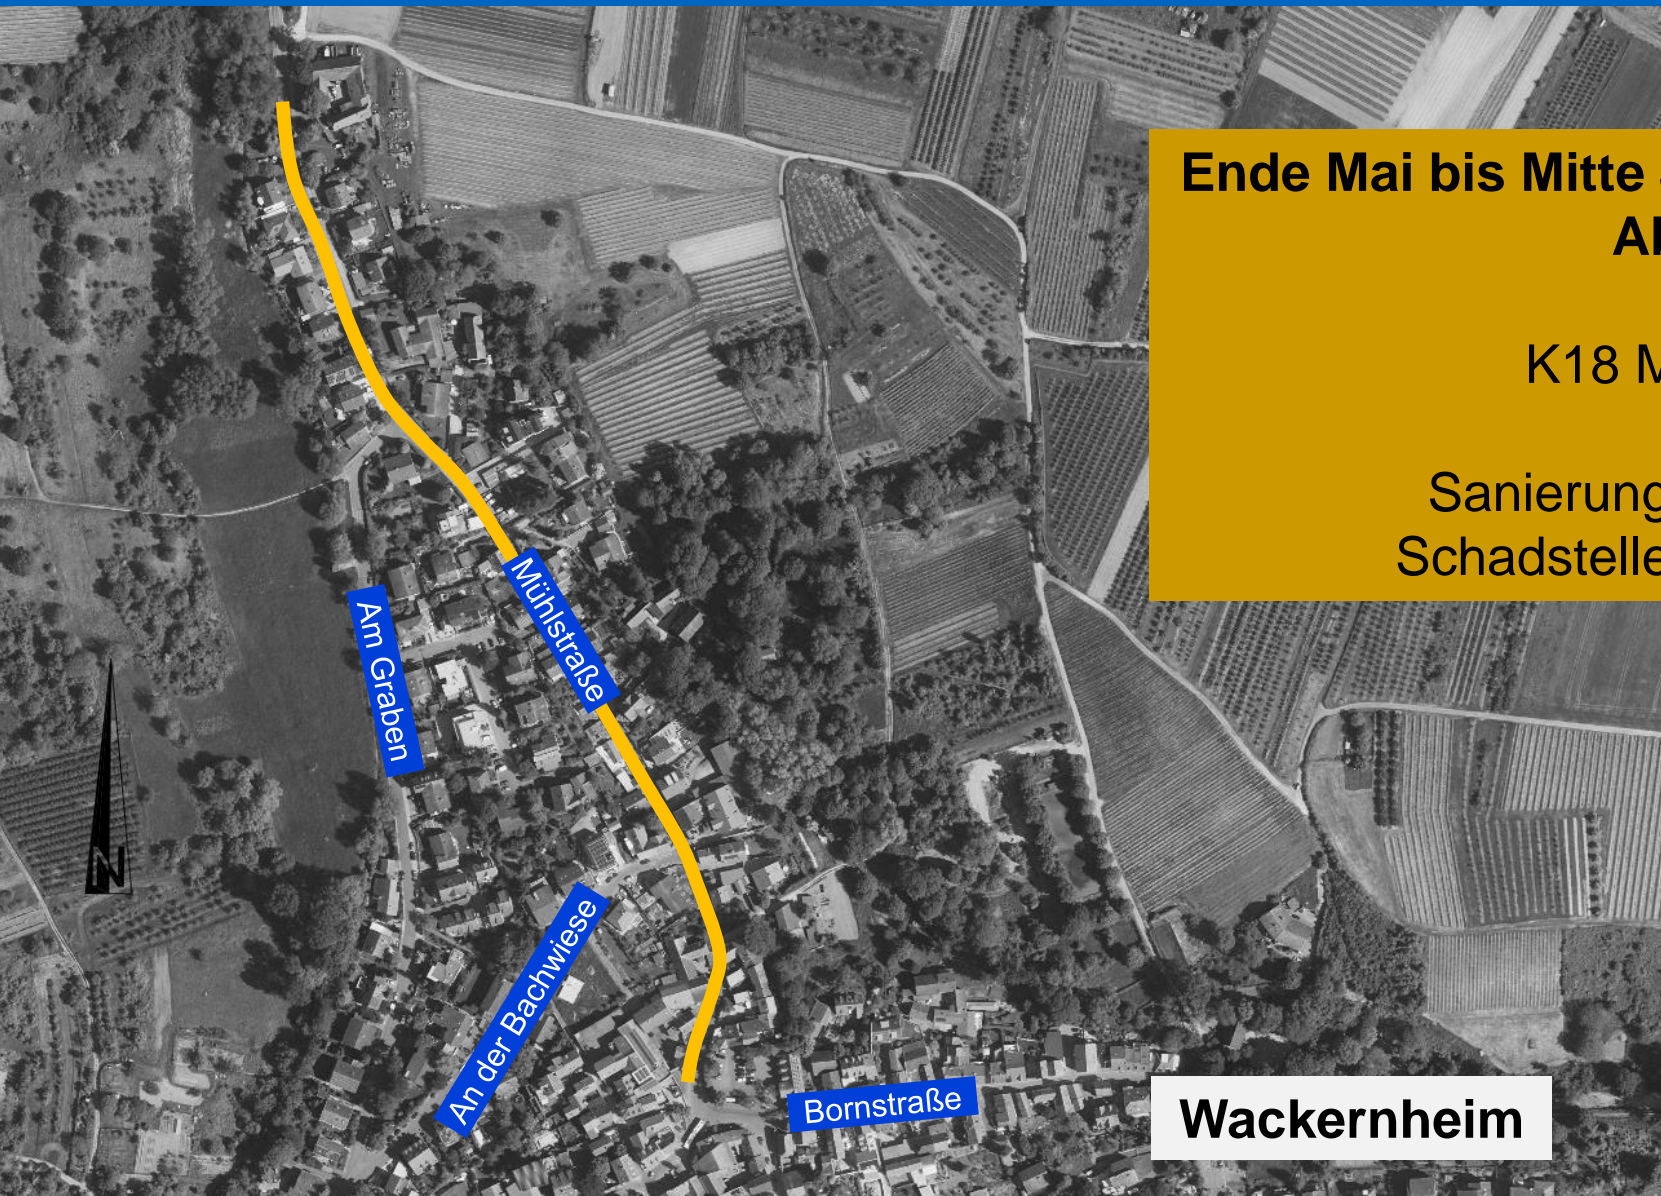


**Ende Mai bis Mitte Juni 2025
Abschnitt 9**

K18 Mühlstraße

**Sanierung mehrerer
Schadstellen der K18**

Wackernheim

**Großräumige Umleitung
L 419 – L 422**

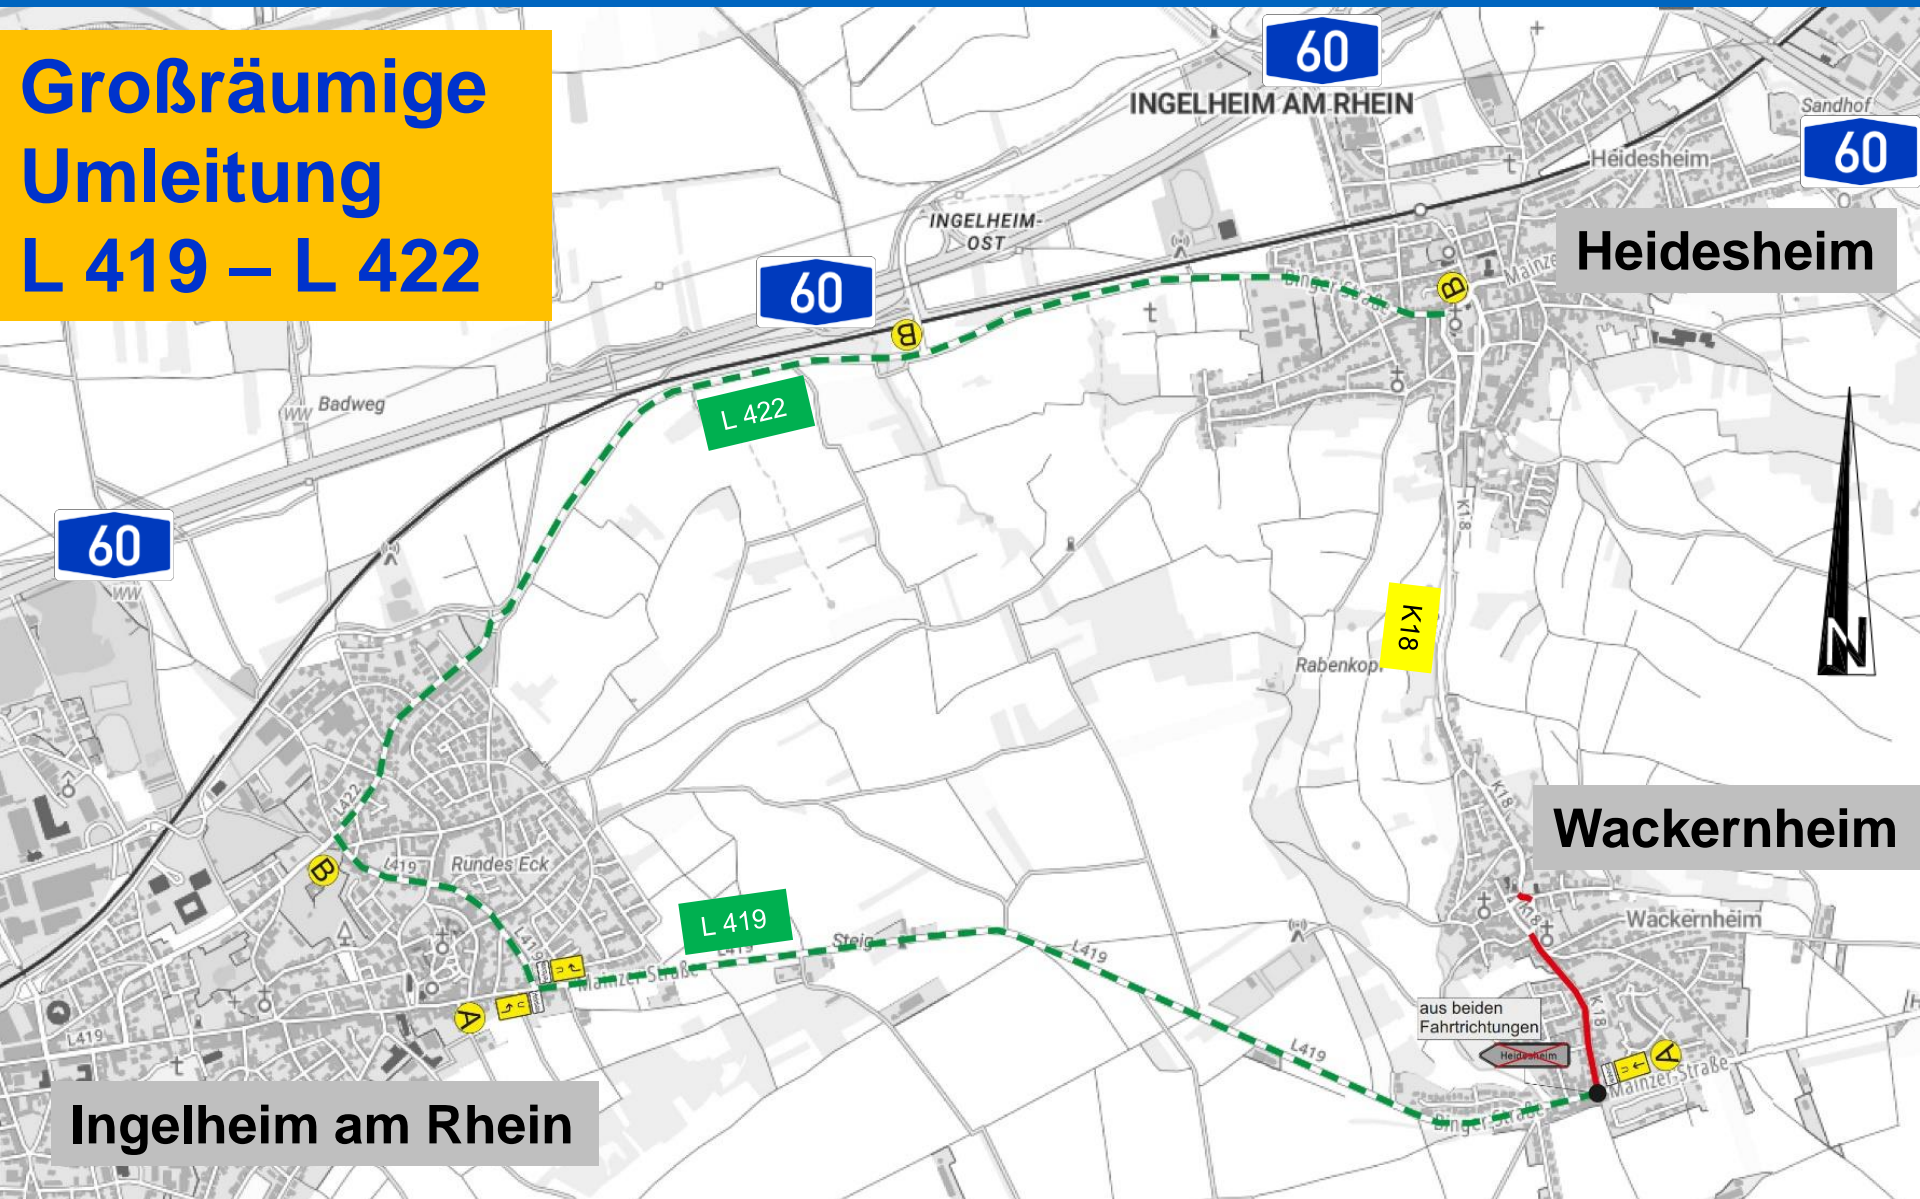

Ingelheim am Rhein

Heidesheim

Wackerndorf



Bild: LBM Worms

Hinweis
Mülltonnen wegen
Zuordnung kennzeichnen!

Baufirma stellt Mülltonnen
zum Sammelplatz und zurück.

Betroffene Buslinien Stadt Ingelheim und Mainzer Mobilität

- Stadtbuslinie 614
- sowie Linie 56 und Linie 80

Hinweis


Buslinie 80 (Heidesheim über Wackernheim nach Ingelheim) kann während der gesamten Bauzeit nicht durch Wackernheim fahren

Für eine Verbindung Heidesheim und Wackernheim ist die **Stadtbuslinie 614 umgelegt**. Ab 17. Juni 2024 wird anstelle von Heidenfahrt der Unterort von Wackernheim angefahren. Heidenfahrt wird für den Zeitraum der Bauarbeiten nur noch **stündlich** durch die **Linie 79** (Budenheim – Heidesheim – Heidenfahrt – Ingelheim) der Mainzer Mobilität angefahren.

Linie 56

- Oberort von Wackernheim nur **stündliche Verbindung** nach Ingelheim und zurück über die **Linie 56** der Mainzer Mobilität
- Bis auf weiteres **halbstündliche Verbindung** von Mainz und Wackernheim bleibt bestehen.
- geänderten Fahrplänen unter:

www.ingelheim.de/busangebot

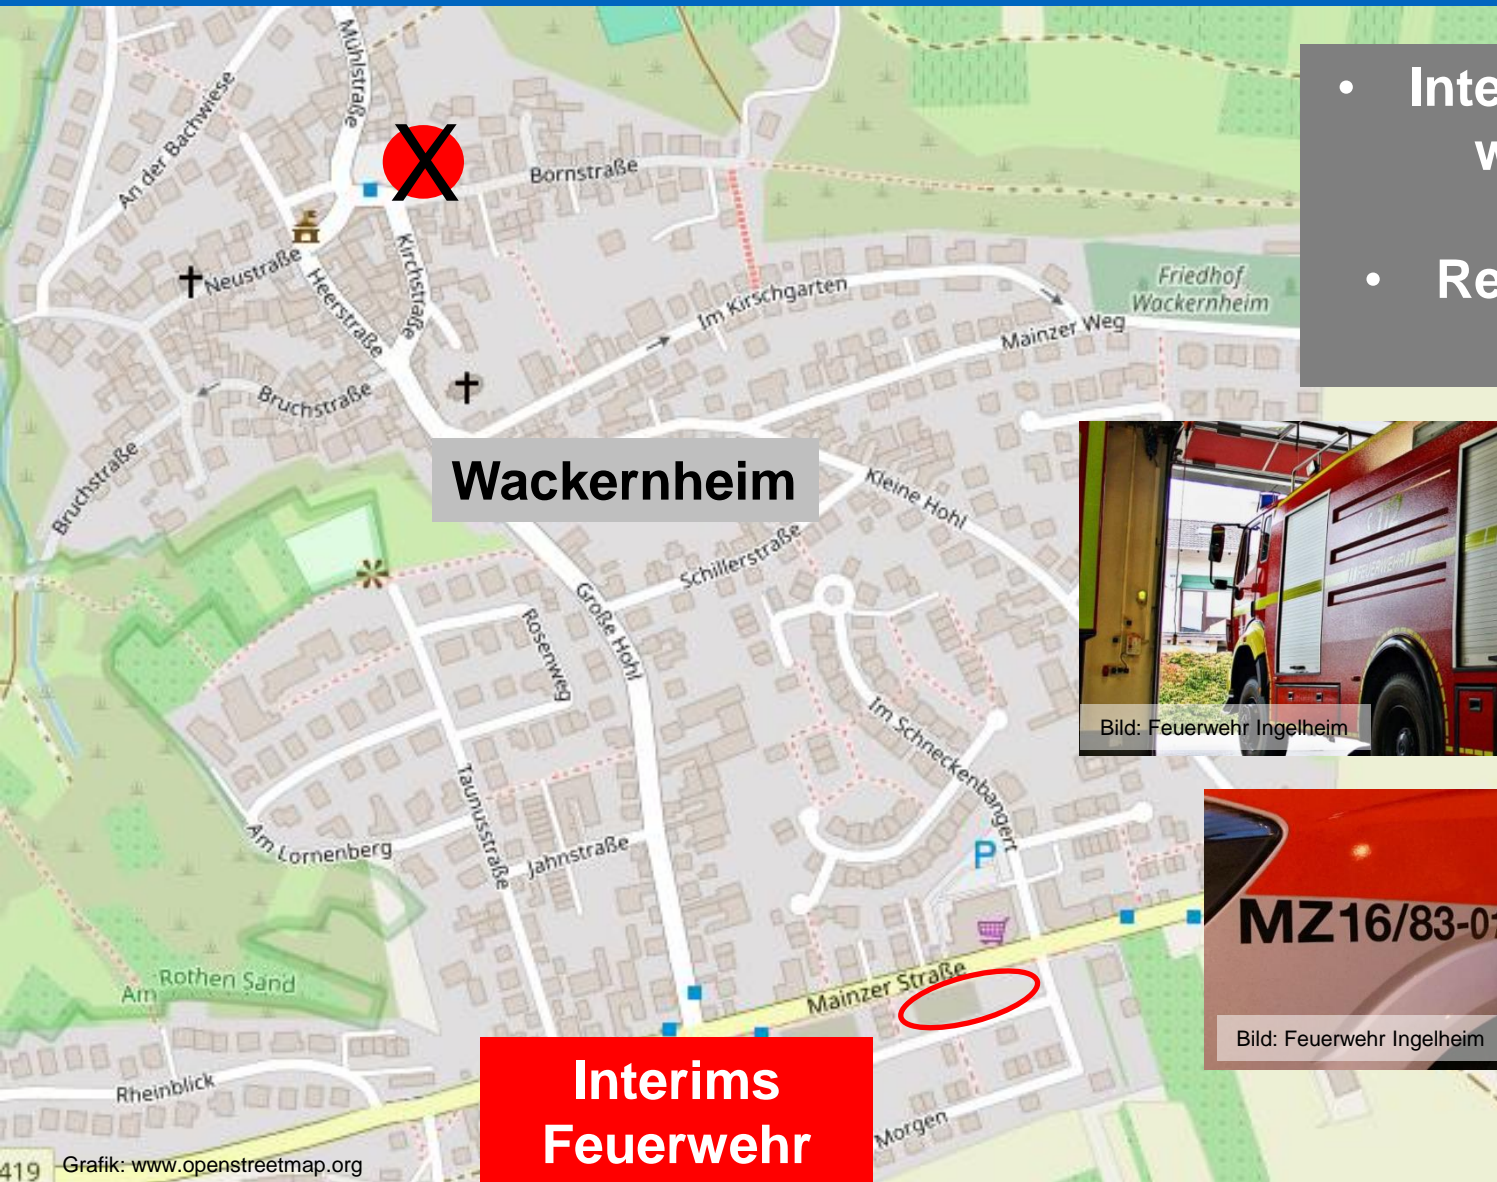

- Interims Feuerwehr wird eingerichtet
- Rettungsdienst ist informiert



Parken

**Parkplatz
Bürgerhaus
18 Stellplätze
Regelung der
Parkzeiten abhängig
von jeweiligem
Bauabschnitt**



Rathausplatz

Wackerndorf

Grafik: www.openstreetmap.org

Themen

- Notwendigkeit der Maßnahme
- Planungen
- Bauliche Umsetzung, Zeitplan und Kosten
- **Kommunikation**

Informationen

www.ingelheim.de

Pressemitteilungen

Hausmitteilungen



Wackernheim

Grafik: www.openstreetmap.org

Fragen an:

lbm@lbm-worms.rlp.de

Vielen Dank!



Wackernheim

Grafik: www.openstreetmap.org
